— УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

СТУДПЛАН

Планировщик учебных заданий



Учебный проект студентов 2 курса

Зайцева Е.А. — руководитель проекта

Толмачева Ю.С. — аналитик

Зубова А.Д. — разработчик

Ефимова У.Д. — тестировщик

Группа: 220451

2026 г.

Команда проекта

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ФИО: Зайцева Е.А.

- планирование проекта;
- распределение задач;
- контроль сроков;
- координация команды;
- контроль достижения целей.

АНАЛИТИК

ФИО: Толмачева Ю.С.

- определение потребностей пользователей;
- формирование требований;
- определение функций приложения;
- проектирование структуры приложения.

РАЗРАБОТЧИК

ФИО: Зубова А.Д.

- создание интерфейса;
- реализация функций приложения;
- хранение данных;
- исправление технических ошибок.

ТЕСТИРОВЩИК

ФИО: Ефимова У.Д.

- проверка основных функций;
- поиск ошибок;
- функциональное тестирование;
- контроль качества итоговой версии.

Проблема и обоснование

ПРОБЛЕМА

Задания разбросаны

Студенты получают задания по разным дисциплинам и хранят информацию в чатах, заметках, электронном дневнике, фотографиях и других местах.

Источники информации

- чаты и сообщения преподавателей;
- заметки и электронный дневник;
- фотографии заданий и другие места хранения.

Риск без единого плана

При таком распределении информации легко потерять задание или пропустить ближайший дедлайн.

Почему проблему важно решить

Один понятный список связывает учебные задания, сроки и статус выполнения в одном месте.

Идея проекта и MVP

ИДЕЯ

Один понятный план

Простой веб-планировщик объединяет учебные задания и сроки выполнения в одном месте.

→

MVP

Работающий MVP

Студент видит дедлайны, управляет заданиями и отмечает выполненные работы.

Основные возможности MVP

- \+ добавить задание
- ✎ изменить задание
- × удалить задание
- ✓ отметить выполнение
- ≡ отфильтровать задания
- ↕ сортировать по дедлайну

Дополнительно: список ближайших дедлайнов

Почему проект актуален

- ✓ решает понятную повседневную проблему студентов
- ✓ не требует финансовых затрат
- ✓ может быть реализован небольшой командой
- ✓ MVP создаётся в ограниченные сроки
- ✓ даёт практический результат

Некоммерческий проект · бюджет 0 ₽ · бесплатные инструменты

Таблица заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	Бюджет	Время	Качество	Приоритет
Студенты	бесплатное использование	быстрый доступ к заданиям	удобный интерфейс и корректные сроки	**высокий**
Руководитель проекта	0 рублей	завершение проекта к 14 декабря	соответствие требованиям проекта	**высокий**
Разработчик	бесплатные инструменты	достаточный срок для реализации MVP	стабильная работа функций	**высокий**
Аналитик	без дополнительных затрат	требования до основной разработки	понятные и полные требования	**средний**
Тестировщик	без дополнительных затрат	время на полноценную проверку	нет известных критических ошибок	**средний**
Преподаватель	без дополнительных затрат	готовность к аттестации	соответствие учебному заданию	**средний**

Компромиссы проекта

Ключевые стороны

студенты | руководитель | разработчик

Приоритет: рабочий MVP к ближайшим дедлайнам без дополнительных затрат.

Основные противоречия и компромиссы

1. Больше возможностей ↔ ограниченные сроки

Компромисс: ограничить первую версию функциями MVP.

2. Разработка ↔ время на проверку

Компромисс: часть тестирования начинается до полного окончания разработки.

3. Качество ↔ бюджет 0 рублей

Компромисс: бесплатные инструменты и простой технологический стек.

SMART-цели 1–3

1 Требования

до 20.11.2026
≥5 функций

До 20 ноября 2026 года определить требования к планировщику учебных заданий и сформировать согласованный командой перечень не менее 5 основных функций MVP.

S набор функций планировщика

M перечень ≥5 функций

A анализ силами аналитика и команды

R основа проектирования и разработки

T до 20.11.2026

2 Прототип

до 27.11.2026
основные элементы интерфейса

До 27 ноября 2026 года подготовить прототип интерфейса «СтудПлана», включающий главный экран со списком заданий, форму добавления и редактирования задания, фильтры и отображение дедлайнов.

S прототип основных экранов

M список, форма, фильтры, дедлайны

A бесплатные средства; срок выполним

R основа разработки MVP

T до 27.11.2026

3 Разработка MVP

до 06.12.2026
≥5 работающих функций планируется 6

До 6 декабря 2026 года разработать работающий MVP веб-приложения «СтудПлан», реализующий не менее 5 основных функций работы с учебными заданиями.

S работающая первая версия

M ≥5 функций; план — 6

A базовый объём для малой команды

R MVP — главный результат проекта

T до 06.12.2026

SMART-цели 4–5

4 Тестирование

до 11.12.2026
≥10 тестов
0 критических ошибок

До 11 декабря 2026 года проверить все основные функции MVP, провести не менее 10 функциональных тестов и устранить все обнаруженные критические ошибки.

S проверка функций и исправления

A небольшой MVP проверяет команда

T до 11.12.2026

M ≥10 тестов; 0 известных критических ошибок

R работоспособная демонстрация

5 Готовый проект

14.12.2026
3 результата
бюджет 0 ₽

К 14 декабря 2026 года подготовить готовый к демонстрации проект «СтудПлан», включающий работающий MVP, результаты тестирования и презентацию проекта, при бюджете 0 рублей и использовании только бесплатных инструментов.

S полный комплект результатов

A простой MVP; бесплатные средства

T 14.12.2026

M MVP + тесты + презентация; 0 ₽

R готовность к аттестации

Задачи проекта и ИСР

СТУДПЛАН

1. АНАЛИЗ

- **1.1** Определение проблемы
- **1.2** Анализ потребностей пользователей
- **1.3** Формирование требований
- **1.4** Определение функций MVP

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- **2.1** Проектирование интерфейса
- **2.2** Определение структуры данных
- **2.3** Подготовка прототипа интерфейса

3. РАЗРАБОТКА

- **3.1** Добавление задания
- **3.2** Редактирование
- **3.3** Удаление
- **3.4** Отметка выполнения
- **3.5** Фильтрация
- **3.6** Сортировка
- **3.7** Сохранение данных


4. ТЕСТИРОВАНИЕ

- **4.1** Подготовка тестов
- **4.2** Проверка основных функций
- **4.3** Фиксация ошибок
- **4.4** Исправление критических ошибок
- **4.5** Повторная проверка

5. ЗАВЕРШЕНИЕ

- **5.1** Финальная проверка MVP
- **5.2** Подготовка результатов тестирования
- **5.3** Подготовка презентации
- **5.4** Подготовка проекта к демонстрации

Диаграмма Ганта

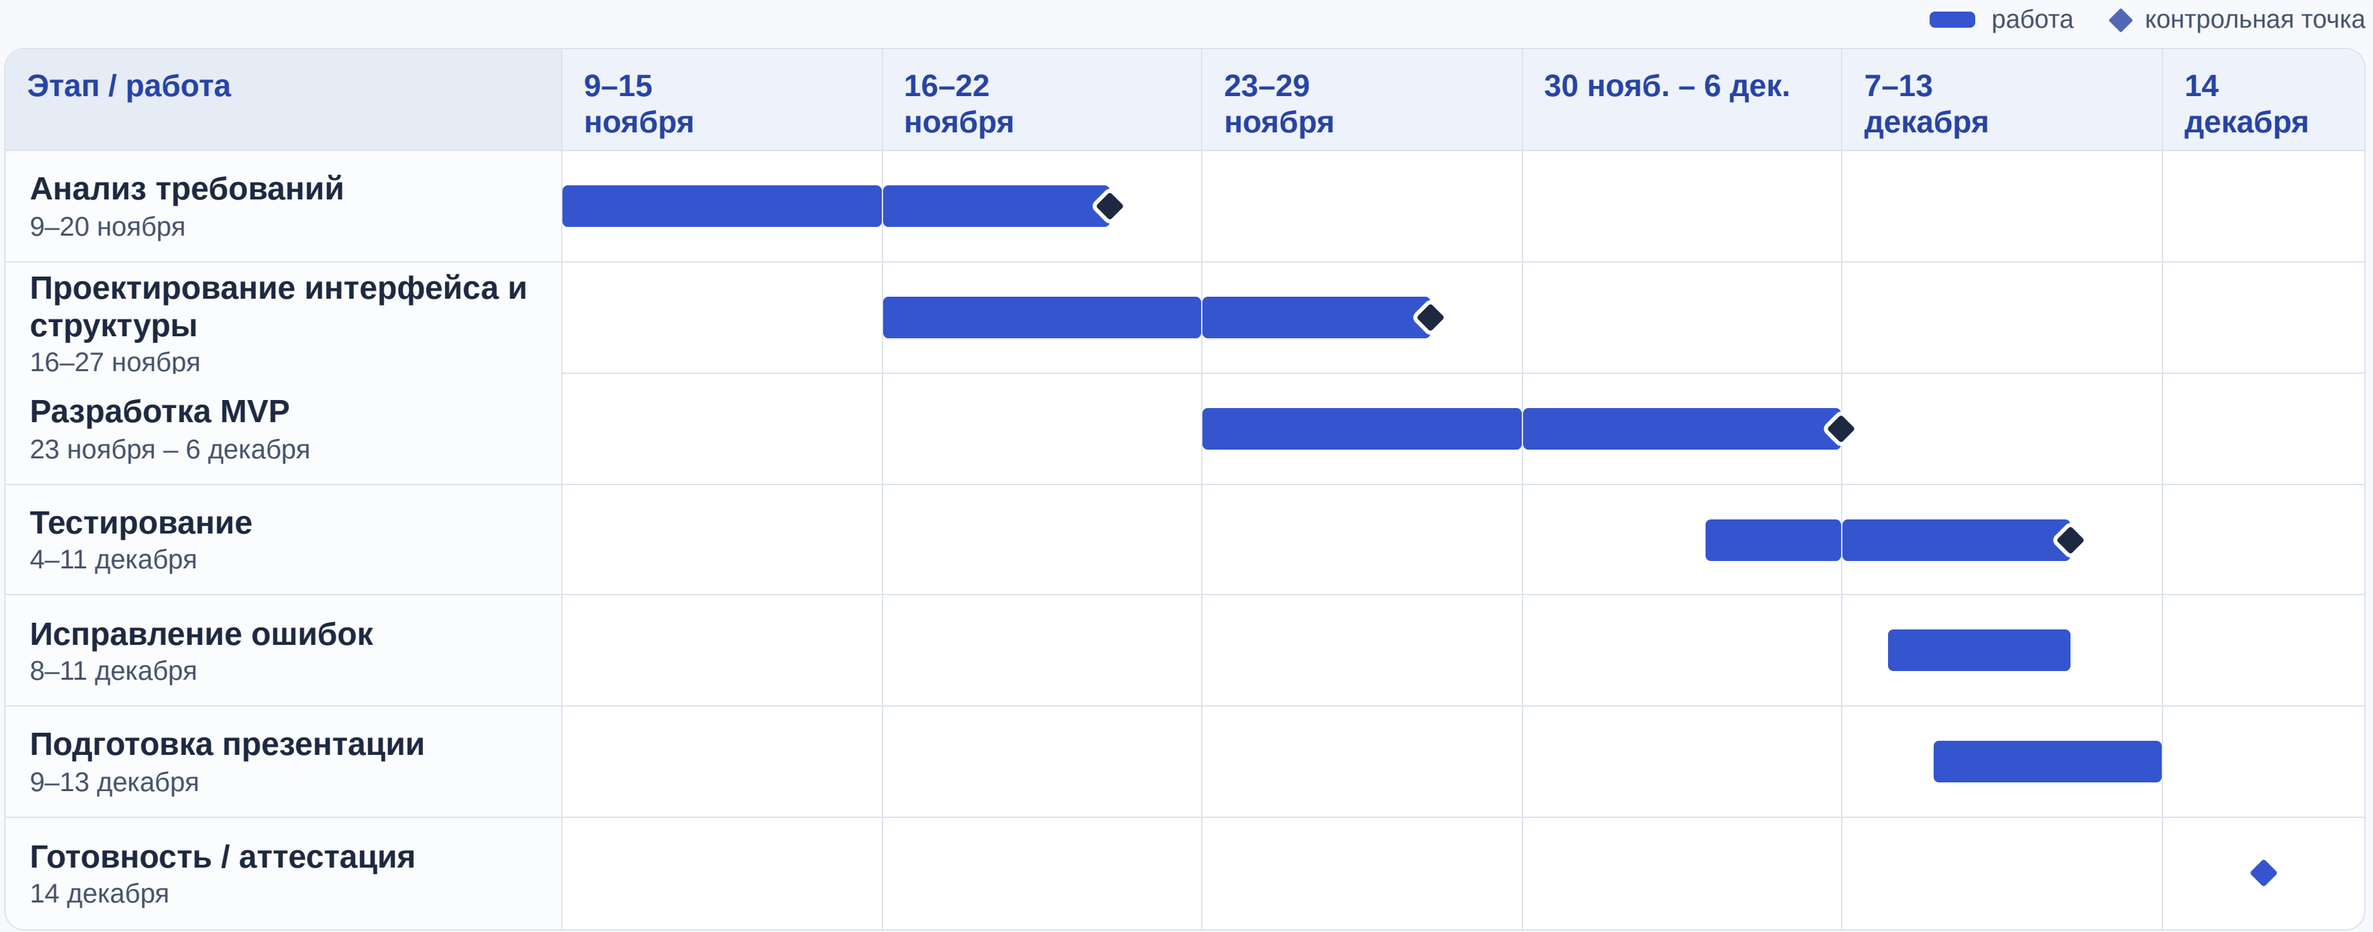

20.11 — требования сформированы

27.11 — прототип интерфейса

06.12 — MVP готов


11.12 — тестирование завершено

13.12 — презентация готова

14.12 — проект готов к сдаче

Этапы частично параллельны: проектирование начинается во время анализа, тестирование — до полного завершения разработки, презентация — после результатов тестирования.

Сетевой график проекта

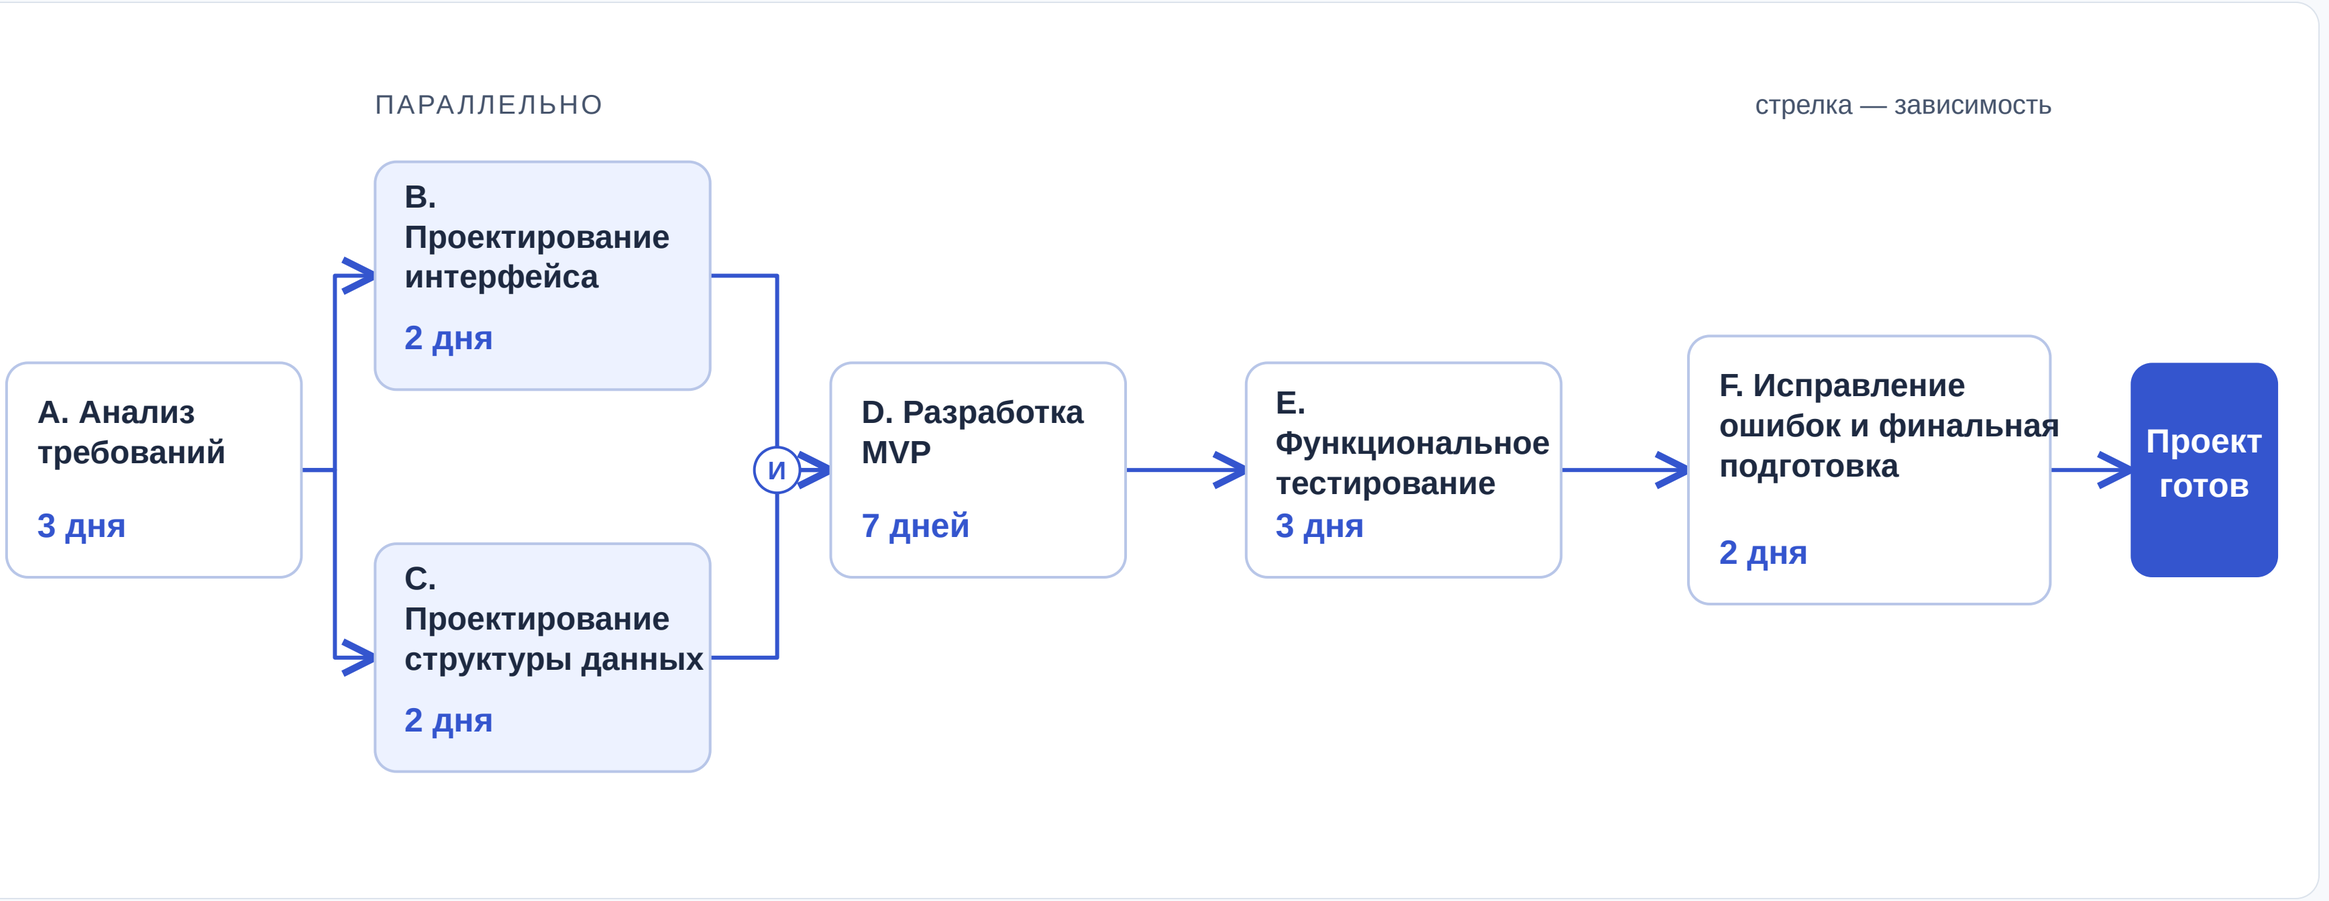

Критическая последовательность

A → B/C → D → E → F. Работы B и C выполняются параллельно, имеют одинаковую длительность и обе должны завершиться до начала разработки D.
